BIPV PROJECT · 기구 설계 검토 회신 2026-10-28 내부 검토안 v3.5 (수평 배기 검토 추가)

유리 LED + PV 합지 패널 기구 설계 검토

업체 기구 설계를 내부에서 검토한 결과입니다. 현 구조(하단만 열린 500×20×300mm 공기층, Hub·SMPS 밀폐 함체), SMPS HWA805V0J-SS ×2, 한낮 400W·야간 200W 운전을 기준으로, 일사와 온도를 Python 계산으로 검증했습니다. v3에서는 개선안을 세 가지로 정리했습니다. 1안은 뒷판을 수직으로 빼는 방법, 2안은 SMPS 핀형 방열 함체 분리, 3안은 장기안으로 48V 배전과 분전반 실내 이전입니다.

열관리·전원 검토
SMPS 수명·디레이팅, 5V·48V 배선

열계산 검증
청천 일사, 열저항망, 개선안·히트싱크 계산

기구·유지보수 검토
FPCB, 개선안 기구성, 방수, 교체

전류 계산
5V 경로 전류·전압강하, 커넥터·케이블 적합성

중재 정리
상충 의견 조정, 수정 요청안, 업체 문안

00 핵심 결론

현 구조에서 SMPS 케이스는 7월 한낮 약 87°C(범위 70~117°C)입니다. 70°C 고장 임계를 넘으므로 방열 개선 요청은 타당합니다.

원인의 대부분은 밀폐 함체에 갇힌 SMPS 자체 손실(약 55W)입니다. 햇빛과 LED 열이 없어도 SMPS 손실만으로 케이스가 74.5°C가 됩니다. 그래서 SMPS 열을 바깥 공기로 내보내는 경로(핀)가 있어야 온도가 내려갑니다.

1안(뒷판을 수직으로 빼기)은 함체를 그대로 쓰면 −3K뿐입니다. 써멀패드와 세로 핀을 더하면 약 62°C(55~73)까지 내려갑니다. 다만 벽과 패널 사이가 250mm 이상 필요하고, 캣워크가 없으면 교체 접근이 어렵습니다.

2안(SMPS 핀형 방열 함체 분리)이 가장 확실합니다. 핀 B안은 약 59°C, D안은 약 54°C입니다. SMPS가 빠지면서 공기층이 150mm로 줄어 뜨거운 구간 면적이 절반이 되고, 공기층과 Hub 쪽 온도도 1~2K 내려갑니다.

3안(48V 배전, 분전반 실내)은 장기 사용에 가장 유리합니다. 패널 쪽 발열이 55W에서 19W로 약 1/3이 됩니다. 2안과 합치면 DC-DC 약 56°C이고, 고장이 잦은 AC-DC 정류기를 실내에서 정비할 수 있습니다. 단기에는 2안으로 가고, 3안으로 바꿀 수 있게 장착 구조를 맞춰 두는 것을 권장합니다.

평소 기온으로 보면 현 구조는 1년에 약 3,500시간 동안 SMPS가 60°C를 넘습니다. 8월 평균 최고기온(30.6°C) 맑은 날에 84°C이고, 4~10월 낮에는 평범한 날에도 70°C를 넘습니다. 2안 B는 같은 날 55°C로, 평년 기온에서는 60°C를 넘는 시간이 없습니다(06장).

세로로 이어 붙이면 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 데워집니다. 어느 안이든 위층 패널 뒤 공기가 14~27K 올라가므로, 2~3장마다 끊어서 옆으로 빼줘야 합니다.

01 계산 전제

항목	값	비고
설치	서울, 남향 수직 외벽, 지상 4~8층, 패널 500×1000mm	
SMPS	HWAWAN HWA805V0J-SS ×2 (5V 80A급, 정격 합 800W)	치수 250×53×26mm, 효율 89%는 형제 모델 값을 쓴 **가정**
운전	한낮 full white 400W, 야간 휘도 절반(약 200W)	SMPS 1대당 부하 50%

현 공기층	폭 500 × 깊이 20 × 높이 300mm 상자, **하단만 개방**	윗면은 FPCB 11개가 지나가서 구멍을 낼 수 없음. 옆면 슬롯과 Al판 뒷면 배기도 불가
함체	Hub board + SMPS 밀폐 함체, Al판에 볼트 체결	340×200×50mm로 **가정**
FPCB	30×100mm 11개, 발열 무시	피복·단락·단선만 검토
열부하 집계	흡수 일사 + LED 발열 + SMPS(또는 DC-DC) 손실	K5+ 제외

공기층 밖의 패널 뒷면은 벽 쪽 공기에 열려 있다고 가정했습니다. 패널 뒤 공기는 외기 +3K로 가정했습니다.
모든 온도는 정오 순간의 정상상태 값입니다.

02 일사 재계산

Q. 수직면 피크 일사는 계산값인가? v1 값은 간이 추정이었습니다. v2부터는 태양위치(NOAA), 대기질량(Kasten-Young), 청천 일사 모델(Ineichen-Perez, Hottel 교차확인), 수직면 변환(Hay-Davies, 지면반사 0.2)으로 월별·시간별 값을 계산했습니다.

Q. 남중고도가 낮으면 햇볕 세기가 줄지 않나? 맞습니다. 대기 탁도를 같게 두면 남중 직달 일사(DNI)는 동지 611, 하지 789W/m²로 동지가 23% 약합니다. 하지만 남향 수직면에 닿는 직달 성분은 입사각 때문에 하지 175, 동지 630W/m²로 뒤집힙니다. 여름에는 유리에 비스듬히 들어오는 빛이 더 많이 반사되어 실제 흡수 가능한 양이 12~14% 더 줄어듭니다.

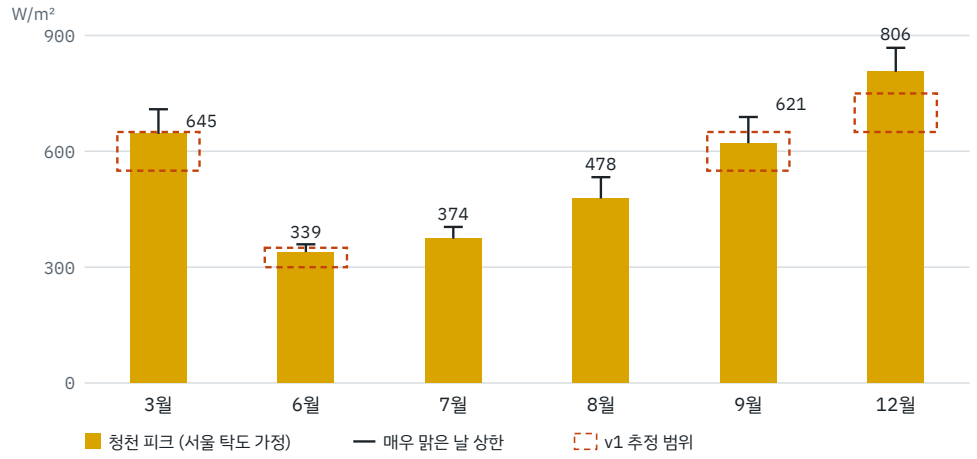


그림 1. 남향 수직면 청천 피크 일사(각 월 21일 남중). 여름은 태양이 높아 수직면에 비스듬히 닿고, 겨울은 거의 정면으로 닿습니다. 청천값은 상한이며, 실제 7월 평균은 장마로 청천의 절반 수준입니다.

월	남중고도	대기질량	DNI	수직면 피크	유리 반사 후 흡수 가능	수직면 일적산	v1 대비
3월	52.4°	1.26	755	645~709	625	16.1 MJ/m²	맞음
6월	75.9°	1.03	719	339~359	293	8.2 MJ/m²	맞음
7월	73.1°	1.04	696	374~404	330	9.0 MJ/m²	설계 기준
8월	64.8°	1.10	699	478~533	445	11.7 MJ/m²	신규
9월	53.4°	1.24	734	621~689	600	15.5 MJ/m²	맞음 (상단 초과)
12월	29.0°	2.06	721	806~868	800	18.0 MJ/m²	v1 과소 (+8~15%)

단위 W/m². 수직면 피크의 앞 값은 서울 월별 탁도 가정, 뒤 값은 매우 맑은 날 상한입니다.

03 패널당 열부하

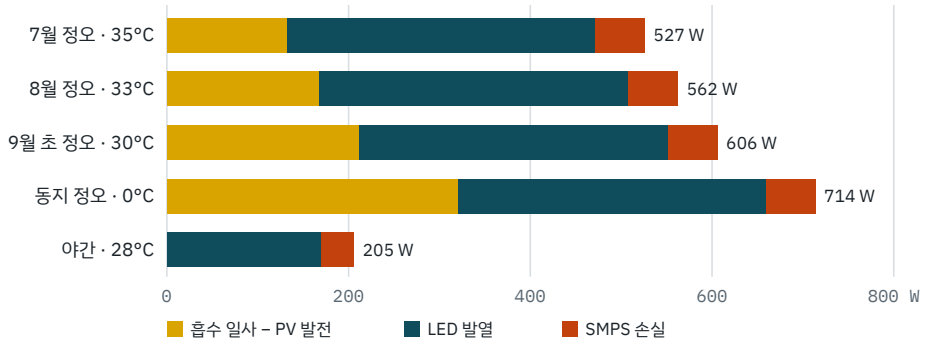


그림 2. 패널 1장(0.5m²)의 열부하 구성(현 SMPS 기준). 낮에는 LED 발열(400W의 85%, 340W)이 가장 큽니다. 일사는 계절에 따라 130~320W, SMPS 손실은 약 55W입니다.

시나리오	수직면 일사	흡수 일사	PV 발전 차감	LED 발열	SMPS 손실	합계 (범위)	3안 합계 (DC-DC)
7월 21일 정오, 외기 35°C	374	149	−17	340	54.5	**527** (472~623)	491 (DC-DC 18.8)
8월 15일 정오, 외기 33°C	456	189	−21	340	54.5	**562** (506~672)	526
9월 5일 정오, 외기 30°C	558	238	−26	340	54.5	**606** (548~725)	571
동지 정오, 외기 0°C	806	360	−40	340	54.5	**714** (652~853)	679
야간 LED 200W, 외기 28°C	0	0	0	170	35.3	**205** (180~244)	181 (DC-DC 10.5)

가정: 흡수율 LED층 0.10 + PV 0.80, PV 효율 10%(부하 미연결 시 0%로 보수 계산), LED 발열 비율 0.85(범위 0.75~1.0), SMPS 효율 50% 부하 88%·25% 부하 85%, DC-DC 효율 95.5%. 단위 W.

04 개선안 구성

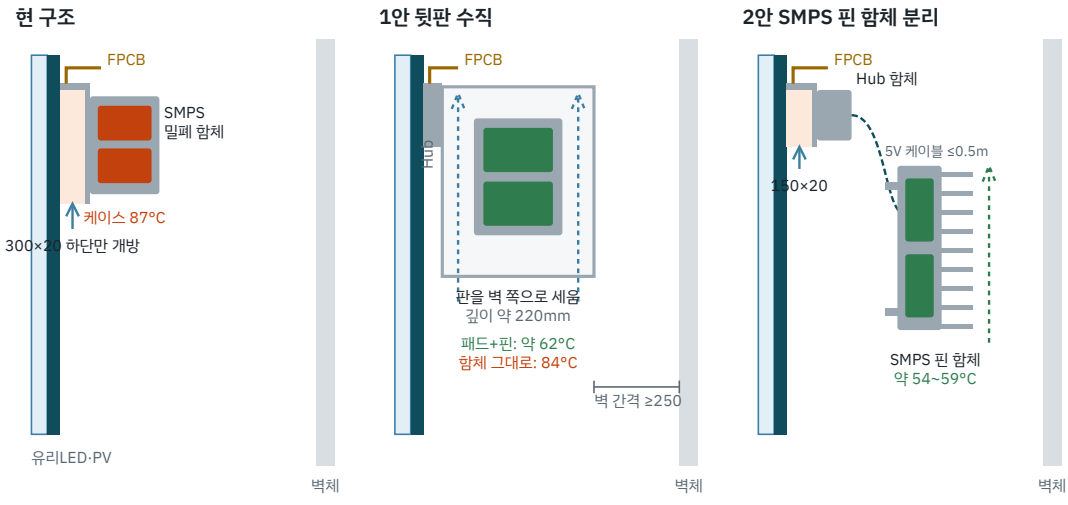


그림 3. 측단면 개념도(비율은 실제와 다름, 7월 한낮 SMPS 케이스 설계값). 1안은 SMPS가 붙은 뒷판을 패널과 수직으로 세워 벽 쪽으로 빼고, Hub는 FPCB 길이 때문에 판 뿌리에 패널과 평행하게 둡니다. 2안은 SMPS만 핀 함체로 빼고 Hub 함체는 작아져 공기층이 150mm로 줄어듭니다.

1안

뒷판을 수직으로 빼기

- Hub+SMPS 함체가 붙은 Al판을 패널에 수직으로 세움(깊이 약 220mm)
- 20mm 막힌 공기층이 사라져 패널 뒷면 전체가 벽 쪽 공기에 노출됨
- 판 양면을 따라 공기가 올라가는 굴뚝 흐름
- Hub는 판 뿌리에 패널과 평행하게 둬야 FPCB 100mm로 연결 가능

2안

SMPS 핀형 방열 함체 분리

- SMPS 2대만 세로 핀 달린 Al 함체로 빼서 그늘 쪽에 배치
- Hub·FPCB는 작은 고정 함체에 남김 → 공기층 300→150mm
- 두 함체는 SMPS별로 나눈 5V 4회로로 연결(10AWG, 0.5m 이하, 10장)
- SMPS 교체 시 FPCB를 건드리지 않음

3안 · 장기

48V 배전 + 분전반 실내

- AC-DC를 48V로 바꿔 실내 분전반에 모음
- 패널에는 48→5V DC-DC만 남김(포팅형, 세라믹 콘덴서 위주)
- 패널 쪽 발열 55W → 19W, 전해콘덴서·AC 입력부가 외벽에서 빠짐
- 단독 적용 또는 2안·1안과 조합 가능

05 온도 계산 결과

패널을 전면유리, PV, 공기층, Al판, 함체, SMPS로 나눈 열저항망으로 계산했습니다. 7월 한낮(외기 35°C, 400W) 설계값이고, 가는 선은 낙관~보수 범위입니다.

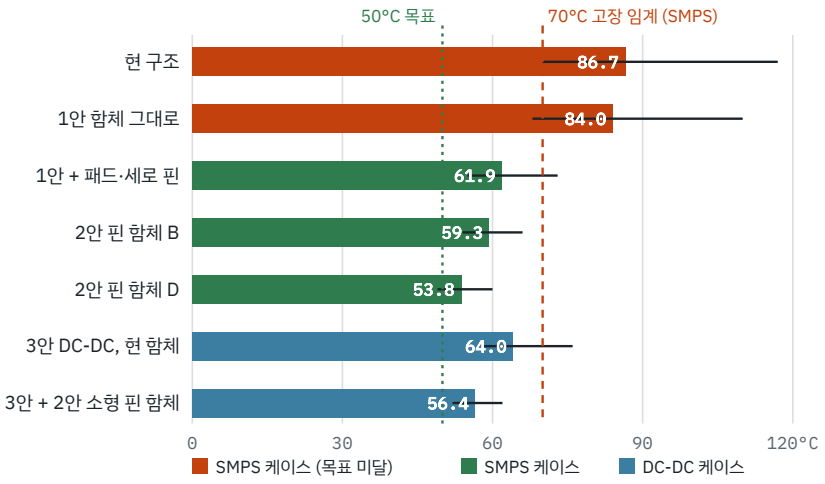


그림 4. 개선안별 케이스 온도(7월 정오 설계값, 하단 패널 기준). 1안은 핀을 달아야 효과가 납니다. 2안은 핀 크기에 따라 54~59°C입니다. 3안의 DC-DC는 포팅형이라 허용 온도가 SMPS보다 높을 가능성이 커서(약 100°C급, 데이터시트 확인 필요) 현 함체 그대로도 여유가 있습니다.

구성	7월: 함체 내부 / 케이스	9월 초 케이스	여름 야간 케이스	비고
현 구조	79.8 / **86.7** (70~117)	84.4	58.8	SMPS 손실만으로 74.5°C
1안 (a) 판 수직, 함체 그대로	77.1 / **84.0** (68~110)	81.3	57.4	패널 유리 93→76°C로는 개선
1안 (b) + 써멀패드 + 세로 핀	60.7 / **61.9** (55~73)	58.4	43.6	뿌리 단열 가스켓 추가 시 60.0°C

2안 핀 함체 B (300×250, 핀 40)	58.7 / **59.3** (54~66)	54.7	42.2	공기층 150mm, Hub 함체 62.9°C
2안 핀 함체 D (400×300, 핀 50)	53.2 / **53.8** (49~60)	49.1	38.8	보수 조건까지 60°C 이하
3안 (i) DC-DC를 현 함체에	62.9 / **64.0** (58~76)	61.9	41.4	바닥 온도는 패널 열로 데워진 Al판 (62.7°C)
3안 (ii) 1안 + 핀	55.0 / **56.1** (49~68)	53.0	38.4	
3안 (iii) 2안 + 소형 핀 함체	55.8 / **56.4** (52~62)	52.2	38.5	핀 함체 200×150, 핀 30mm, 약 0.9kg

2안 공기층 축소 효과 (300 → 150mm)

7월, 핀 함체 B	공기층 300	공기층 150
공기층 공기	76.3	74.6
FPCB 구간 유리 / PV	90.9 / 92.1	90.0 / 91.0
Hub 함체 (Al판)	63.4	62.9
SMPS 케이스	58.9	59.3

뜨거운 구간(유리 90°C대) 면적이 패널의 30%에서 15%로 절반이 됩니다. SMPS는 핀 함체로 직접 방열하므로 공기층 영향을 거의 받지 않습니다. FPCB 구간은 LED 열이 지배해 크게 내려가지 않습니다.

세로로 이어 붙일 때 (16장, 벽 쪽 측면이 막힌 경우)

벽 간격	최상단 뒤 공기 상승	1안 최상단 SMPS (a) / (b)
250 mm	+26.5 K	90.6 / 80.0
300 mm	+23.0 K	88.5 / 77.3
400 mm	+18.6 K	85.7 / 73.9
600 mm	+13.9 K	82.7 / 70.3

패널마다 뒤로 150~245W를 내보내 위로 갈수록 데워집니다. 2안도 같은 이유로 상부 패널이 오릅니다(벽 간격 100mm에서 하단 55°C → 상단 82°C). 2~3장마다 수평으로 끊고 옆으로 빼줘야 합니다.

추가로 볼 점: 공기층 구간의 전면 LED 유리층이 계산상 90°C 안팎까지 올라갑니다(1안은 공기층이 없어져 약 76°C). LED 필름, OCA 접착층, FPCB 커넥터의 허용 온도를 업체에 확인해야 합니다.

06 평균 기온에서의 실제 온도

앞 장의 온도는 외기 35°C 한여름 최악 조건입니다. 여기서는 서울 월별 평년 기온(평균 최고·최저)에 열부하를 더해 **평소에 실제로 몇 도가 되는지** 계산했습니다. 평균 최고기온에 맑은 날 일사를 더한 조건은 "흔한 더운 맑은 날"에 해당합니다.

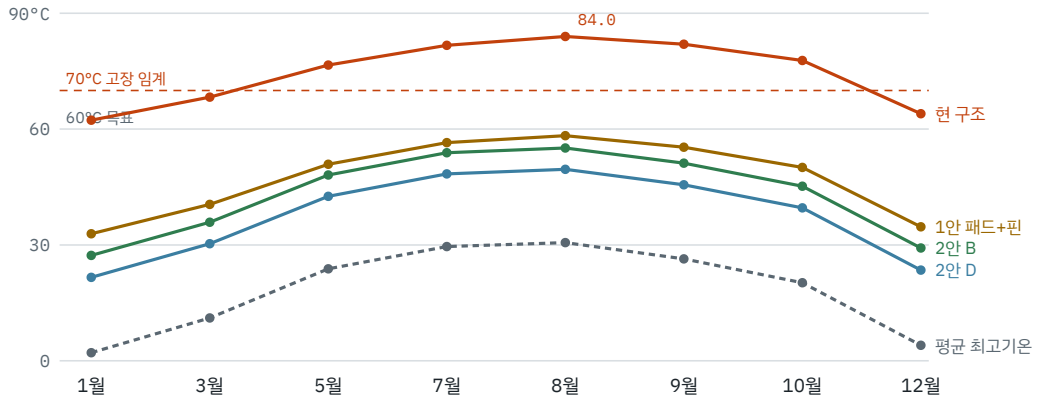


그림 5. 월별 평균 최고기온의 맑은 날 정오(LED 400W)에 SMPS 케이스 온도. 현 구조는 평범한 날에도 4~10월 내내 70°C를 넘습니다. 2안은 가장 더운 8월 평균일에도 55°C 이하입니다. 월별 값은 아래 표에 있습니다.

월	평균 최고기온	현 구조 유리 / PV	현 구조 SMPS	1안 SMPS	2안 B SMPS	2안 D SMPS	3안 DC-DC

1월	2.1	84 / 89	62.3	32.9	27.3	21.6	25.4
3월	11.1	85 / 88	68.3	40.5	35.9	30.3	33.7
5월	23.8	85 / 86	76.6	50.9	48.1	42.6	45.2
7월	29.6	89 / 91	81.7	56.5	53.9	48.4	51.0
8월	30.6	94 / 97	**84.0**	58.3	**55.1**	49.6	52.5
9월	26.4	96 / 100	82.0	55.3	51.2	45.6	48.9
10월	20.2	96 / 100	77.8	50.1	45.2	39.6	43.2
12월	4.0	85 / 90	64.0	34.7	29.2	23.5	27.3
8월 밤 (약 25°C, 200W)	24.8	–	55.8	40.5	39.0	35.6	35.3

맑은 날 정오 기준, 단위 °C. 구름 낀 평균 하늘이면 SMPS는 0.3~3K만 낮습니다. SMPS 온도는 외기와 자체 손실이 지배하기 때문입니다. 반대로 유리와 PV는 일사 영향이 커서 **9~10월이 가장 뜨겁습니다**(현 구조 PV 약 100°C). 기온은 기상청 1991~2020 평년값 근사치이므로 정확한 값은 기상청 자료로 확인해야 합니다.

간편 환산: 외기 + ΔT

구성 · 위치	여름 낮	겨울 낮	밤 200W
현 구조 SMPS	+53	+59	+31
현 구조 PV	+63	+83	+25
1안 SMPS	+27	+31	+16
2안 B SMPS	+24	+25	+14
2안 D SMPS	+19	+20	+11
3안 DC-DC	+21	+23	+11
2안 공기층 구간 PV	+58	+78	+21

원하는 외기 온도에 더하면 됩니다. 예: 외기 30°C 여름 낮 → 현 구조 SMPS 약 83°C, 2안 B 약 54°C. 여름 낮은 7월 맑은 날 일사(374W/m²), 겨울 낮은 12월(806W/m²) 기준이고, 봄·가을은 사이 값입니다. 세로로 이어 붙여 위층 뒤 공기가 더 데워지면 그만큼 더합니다.

1년 동안 SMPS가 넘는 시간 (추정)

구성	60°C 초과	70°C 초과	60°C를 넘기는 외기
현 구조	약 3,400~3,700 h	약 2,100~2,300 h	외기 약 5°C 이상이면 낮에 넘음
1안 패드+핀	연 수십 h	0	약 33°C 이상 폭염일
2안 B	0 (평년일)	0	약 36°C 이상 극한일
2안 D	0	0	약 41°C 이상 (사실상 없음)
3안 DC-DC	0	0	약 39°C 이상

월별 평년 최고·최저 기온을 사인곡선으로 이어 시간별로 계산했습니다. 해가 떠 있는 동안 400W, 나머지 200W로 보수적으로 가정했습니다. 평년값 하루를 쓰므로 더운 날의 변동은 반영되지 않습니다.

07 개선안 비교

	1안 뒷판 수직	2안 SMPS 핀 함체 분리	3안 48V + 분전반 실내 (장기)
7월 케이스	함체 그대로 84°C, 패드+핀 약 62°C	**B 59°C / D 54°C**	DC-DC 56~64°C (허용 온도 높음)
패널·FPCB 쪽	공기층이 없어져 유리 약 76°C로 가장 유리	공기층 150mm로 뜨거운 면적 절반	조합한 안을 따름
FPCB 경로	Hub를 판 뿌리에 패널과 평행하게 둬야 100mm로 가능. 아니면 150mm 이상 재설계	현 경로 유지	변경 없음
벽 쪽 공간	**250mm 이상 필요**, 외벽 돌출 약 250~350mm	핀 함체 깊이만큼(약 100mm) 필요	배선 경로와 슬래브 관통 필요

구조	판 끝에 함체 3~5kg이 달린 캔틸레버. 패널 프레임에 장당 5~7N·m 추가 모멘트, 진동·볼트 풀림 검토	SMPS 함체를 건물 쪽 서브프레임에 독립 고정 가능	패널 쪽 부품이 가벼워짐
교체 접근	판이 패널 뒤에 숨어 앞(곤돌라)에서 접근 불가. **캣워크나 실내 점검구가 있어야 유효**	원터치 교체, FPCB 건드리지 않음	정류기는 실내 분전반에서 정비. 패널에는 DC-DC만
핵심 리스크	벽 간격, 교체성, 위층 누적 열	5V 회로당 20A 커넥터 여유 부족, 커넥터 풀림 시 과열(10장)	초기 개발비, 48V 배선·보호 설계, DC-DC 데이터 확보
판정	캣워크가 있고 벽 간격이 충분할 때만	**단기 기본안**	**장기안**. 2안을 3안으로 바꿀 수 있게 설계

중재 의견: 열 쪽 검토와 기구 쪽 검토 모두 2안을 단기 기본안으로 봤습니다. 1안은 열 성능은 비슷하지만 벽 간격과 교체 접근 조건이 까다롭습니다. 3안은 장기 신뢰성이 가장 좋으므로, **2안의 SMPS 함체를 나중에 DC-DC 함체로 바꿔 끼울 수 있도록 볼트 패턴과 커넥터 위치를 지금부터 표준화**할 것을 요청합니다.

08 3안 장기안: 48V 배전과 분전반 실내 이전

v1에서 제안한 내용을 다시 넣었습니다. 외벽에 AC 입력 SMPS를 두지 않고 48V로 배전하면, 고장이 잦은 부품을 실내로 옮겨 장기 사용과 유지보수에 유리합니다.

구성과 효과

- 실내 분전반에 48V AC-DC 정류기를 모으고 N+1로 이중화합니다(핫스왑).
- 패널에는 48→5V DC-DC(효율 95~96%, 포팅형)만 둡니다. 발열은 55W에서 19W로 줄어듭니다.
- PFC, 고압 전해콘덴서, AC 입력부가 외벽에서 빠져서 옥외 고장원과 감전 위험이 줄어듭니다.
- 정류기 정비는 곤돌라 없이 실내에서 합니다.
- 전체 손실(패널 19W + 선로 16W + 실내 23~33W)은 현행과 비슷합니다. 효율 이득이 아니라 **외벽의 열원과 정비 위치를 옮기는 것**이 목적입니다.


48V 배선 (패널당 400W)

편도 30m	전압강하	선로손실
4 mm²	2.70 V (5.6%)	23.6 W
6 mm²	1.80 V (3.8%)	15.7 W
10 mm²	1.08 V (2.3%)	9.4 W

패널당 약 8.7A(야간 4.4A). 여러 장이 간선을 공유하면 전류가 합산되므로 단면적을 다시 산정합니다(예: 6장 묶음 54A면 10~35mm²).

검토 항목	내용
안전 전압 (SELV)	정류기 최대 출력과 과전압 보호가 60V DC 이하이고, 1·2차가 강화절연되고, PV 회로와 분리되어 있으면 SELV 범위입니다. 옥외 습윤 장소는 허용 접촉전압이 더 낮을 수 있어 KEC 확인이 필요합니다. IP67 커넥터와 절연으로 직접 접촉을 막는 것을 전제로 합니다.
보호	분전반에 피더별 DC 정격 차단기나 퓨즈, 외부 인입부에 DC SPD, 프레임 등전위 접지
배선 경로	외벽·슬래브 관통부에 슬리브와 내화충전, 외부 인입은 아래로 처진 drip loop, 패널 분기는 IP67 분기함
패널 커넥터	48V 약 9A, IP67 2극 + PE, 키잉
현 설계에 미리 반영할 것	① 2안 SMPS 함체와 DC-DC 함체의 장착 호환(볼트 패턴, 커넥터 위치) ② AC 입력 커넥터 자리에 48V 커넥터가 들어갈 공간 ③ DC-DC→Hub 5V 경로를 짧게 유지 ④ 건축 단계에서 외벽 내측 배선 경로와 슬래브 관통 위치 확보

09 SMPS 핀 함체 히트싱크 (2안)

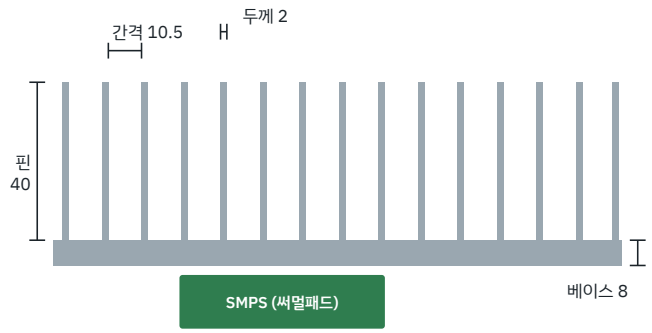

위에서 본 단면. 핀은 세로 방향, 베이스 300(세로)×250mm, 20개, 압출 6063, 단위 mm

그림 6. 권장 핀 단면(B안). 비율은 실제와 다릅니다.

안	베이스 (세로×가로)	핀 높이 / 두께 / 간격 / 개수	공법	열저항 R_{sa}	단독 케이스 (뒤 공기 41 / 38°C)	무게
A	250×200	40 / 2 / 10 / 17	압출 6063	0.49 K/W	69.8 / 66.8	2.0 kg
B (권장 1)	300×250	40 / 2 / 10.5 / 20	압출 6063	0.39 K/W	64.9 / 61.9	2.9 kg
C	300×250	50 / 3(테이퍼) / 10.5 / 19	다이캐스트 ADC12	0.35 K/W	65.0 / 61.9	3.9 kg
D (권장 2)	400×300	50 / 2 / 11 / 23	압출 6063	0.27 K/W	59.4 / 56.3	5.1 kg
팬 (1.5 m/s)	250×200	30 / 1.5 / 4 / 37	압출	0.06 K/W	46.4	–

위 온도는 히트싱크만 단독 계산한 값입니다(SMPS 2대 손실 54.5W). 패널 전체 망에서는 함체 옆면으로도 열이 빠져서 B안 약 59°C, D안 약 54°C입니다.

핀 설계 요점

- **간격:** 세로 길이 250~300mm에서 자연대류 최적 간격은 약 10~11.5mm입니다. 더 촘촘하면 공기가 못 빠져서 나빠집니다.
- **두께:** 1.5~3mm 사이는 차이가 거의 없습니다(핀 효율 0.98 이상). 압출 2mm면 충분합니다.
- **높이:** 20mm에서 50mm로 키우면 열저항이 0.69에서 0.43K/W로 줄어듭니다. 40~50mm를 권장합니다.
- **방향:** 반드시 세로입니다. 가로 핀은 자연대류 성능이 크게 떨어집니다.

설치·표면

- 벽 쪽 그늘에 둡니다. 9월 직사광을 받으면 흑색 아노다이징은 +8~11K, 투명 아노다이징은 +3~6K입니다.
- 표면은 투명 아노다이징이나 백색 고방사 도장으로 합니다.
- SMPS와 베이스 사이 써멀패드, 핀은 함체 바깥. 함체는 IP65 이상에 ePTFE 벤트.
- 팬을 쓰면 46°C까지 내려가지만, 팬이 멈춰도 B·D안 수준을 유지하도록 설계합니다.

10 5V 연결 검토: XT90 ×4 + 실리콘 케이블 (2안)

2안에서 SMPS 핀 함체와 Hub 함체를 잇는 5V 경로는 **패널당 XT90 4개(SMPS당 2개)와 실리콘 케이블 편도 0.5m**로 구성합니다. SMPS 1대가 한낮 400W에서 **40A**를 내고, 이를 XT90 2개로 나눠 커넥터 1개당 **20A**가 흐릅니다. XT90은 판매처 기준 40A 연속 정격으로 보았고, Amass UL 기준(30A)으로도 함께 확인했습니다. 두 SMPS 출력은 서로 묶지 않습니다. 함체 내부 온도는 설계 63°C, 보수 75°C로 보았습니다.

> **케이블은 실리콘 10AWG입니다.** 커넥터당 20A에서 63°C 함체 안 허용 전류가 27.2A, 75°C에서도 20.2A로 20A를 감당합니다(도체 90°C 기준). 12AWG는 75°C에서 도체 108°C로 부족하고, 8AWG는 여유는 크지만 굵고 뻣뻣해서 0.5m에는 필요 없습니다.

> **XT90은 정상 운전에서 여유가 있습니다.** 40A 정격 기준으로 63°C 허용 29.0A, 75°C 허용 24.5A라서 20A는 각각 69%, 82%입니다. 하우징 추정 온도는 63°C에서 81~87°C, 75°C에서 94~99°C로 설계 상한(105°C) 안에 들어옵니다.

전압도 충분합니다. SMPS 5.0V에서 Hub 입력 4.85~4.88V, LED 모듈단 4.55~4.68V입니다(75°C, 접점 공칭~노후).

커넥터 1개가 빠지면 같은 SMPS의 나머지 1개에 40A가 몰립니다. 하우징이 146~167°C까지 올라 녹을 수 있으므로, 회로별 퓨즈나 온도 감시와 결합부 고정이 필요합니다.

XT60 + 11AWG보다 나아집니다. 0.5m에서 전압강하 156→121mV, 하우징 107→94°C(75°C)입니다. 다만 방수와 잠금이 없다는 점은 XT60과 같습니다.

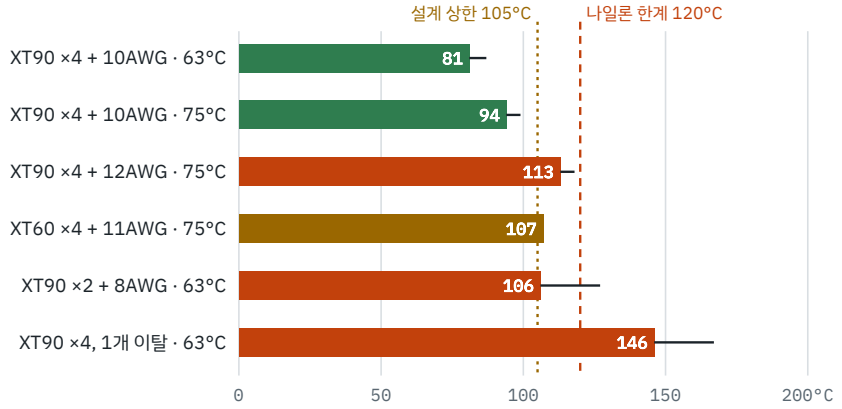


그림 7. 구성별 커넥터 하우징 추정 온도(정상 운전, 막대는 공칭 접점, 가는 선 끝은 노후 접점). XT90 4개 + 10AWG는 75°C 보수 조건까지 설계 상한 안에 들어옵니다. 같은 SMPS 쪽 커넥터 1개가 빠지면 남은 1개가 40A를 받아 한계를 크게 넘습니다. 계산 모델 값이므로 시험으로 확인해야 합니다.

케이블 (20A/회로, 4회로 근접)	허용 63°C	허용 75°C	75°C 도체
12AWG	18.5 A	13.8 A	108°C
10AWG (선정)	27.2 A	20.2 A	90°C
8AWG	38.4 A	28.7 A	82°C

XT90 허용 전류	40A 정격 기준	30A(UL) 기준	20A의 비율 (40A /
25°C	40.0 A	30.0 A	
63°C	29.0 A	21.7 A	
75°C	24.5 A	18.4 A	8

허용 전류는 도체 90°C 기준이며, 커넥터 허용치는 I = 정격·√((105−주변온도)/80) 모델로 계산한 가정값입니다. 보수적인 UL 30A 기준으로 보면 75°C에서 9% 초과이므로, 75°C까지 가는 환경이면 커넥터를 덜 뜨거운 SMPS 함체 쪽에 두는 것이 좋습니다.

10AWG, 편도 길이	0.3 m	0.5 m	1.0 m
총 전압강하	86~112 mV	121~147 mV	208~234 mV
Hub 입력	4.89~4.91 V	4.85~4.88 V	4.77~4.79 V
LED 모듈단	4.59~4.71 V	4.55~4.68 V	4.47~4.59 V
패널 경로 손실	6.9 W	9.7 W	16.6 W

상황	커넥터 전류	결과
한낮 400W	20 A ×4	적합
야간 200W	10 A ×4	여유
접촉저항 편차 ±50%	최대 21.6 A	한계 안
커넥터 1개 이탈	40 A ×1	과열, 보호 필요
SMPS 1대 고장	해당 쪽 0 A	화면 절반 소등, 반대쪽 20 A ×2
SMPS 과전류 보호 구간 (80A)	40 A ×2	과열, 휘도 상한으로 차단

SMPS 출력 5.0V, 원격 센싱 없음, 함체 내부 75°C 보수 조건. LED 모듈단은 Hub 입력에서 FPCB 강하 0.2~0.3V(가정)를 뺀 값이며, 요구 전압 4.5V(가정)로 판정했습니다. 경로 손실은 대부분 Hub 함체 안팎의 열로 남습니다.

위치	문제점	예상 현상	개선

XT90 방수	IP 등급 없음(XT90H도 방수 아님)	결로·누수로 접점 산화, 저항 상승, 과열	함체 안에만 설치, 함체 IP66 이상 + 벤트, 커넥터는 함체 위쪽에 배치
XT90 체결	잠금 없음, 마찰로만 유지	진동·열 사이클로 반쯤 빠짐 → 같은 SMPS의 다른 커넥터에 40A 집중	결합부를 브래킷에 고정, 양쪽 100mm 안에 P-클램프, 삽입 깊이 마킹
10AWG 납땜	굵은 도체라 냉땜이 생기기 쉬움	접합 저항 상승, 진동 시 피로 단선	100W 이상 인두와 지그, 단면 검사
케이블 굴곡·관통	10AWG 외경 약 5.4mm, 최소 굽힘반경 32mm. 실리콘 피복은 연하고 외경 편차가 있음	납땜부 응력, 글랜드 누수나 피복 손상	굽힘 여유 확보, 납땜부 직후 클램프, M12(3~6.5mm) IP68 단심 글랜드(외경 실측 후 선정)
체결 수명·위조품	반복 착탈·고온으로 스프링 장력 저하. 비정품은 도금 품질 편차	특정 커넥터만 과열·변색	정품 XT90H, 입고 시 mΩ 샘플 측정, 착탈은 정비 시에만
고장 시 집중	커넥터 1개 이탈 시 40A, SMPS 과전류 보호 구간에서 회로당 40A	과열·용융	회로별 30A 퓨즈 또는 NTC 온도 감시, SMPS당 40A 휘도 상한

권장 구성

- **커넥터:** 정품 XT90H 4개(SMPS당 2개). Hub 쪽도 SMPS별로 부하를 나누고 두 SMPS 5V를 묶지 않음. XT90-S(안티스파크)는 5V에서 불필요
- **케이블:** 실리콘 10AWG, 편도 0.5m
- **배치:** 커넥터는 함체 안, 가능하면 덜 뜨거운 SMPS 핀 함체 쪽
- **휘도 상한:** Colorlight에서 SMPS당 40A(패널 400W) 이하로 제한, 과전류 보호 구간 운전 금지
- **보호(둘 중 하나):** 회로별 30A 블레이드 퓨즈(약 50mV 추가 강하, 1W 발열, 1개 이탈 시 수 분 안에 끊어져 해당 쪽 소등). 또는 XT90 옆 NTC로 85°C 휘도 감축, 95°C 차단

검증 시험

- **출하 검사:** 회로별 루프 저항 4선식 측정. 0.5m 10AWG 기준 약 5mΩ 이하, 회로 간 편차 ±20% 이내
- **통전 검사:** 20A 30분 통전 후 열화상 확인. 같은 패널 다른 커넥터보다 10K 이상 높으면 재작업
- **열시험:** 63°C 항온에서 회로당 20A 2시간. 하우징 105°C 이하, 시험 전후 저항 변화 10% 이내
- **정기 점검:** 연 1회 여름 한낮에 열화상과 mΩ 재측정

중재 의견: 패널당 XT90 4개(SMPS당 2개, 커넥터당 20A)에 실리콘 10AWG 0.5m 구성은 정상 운전에서 커넥터·케이블·전압 모두 여유가 있습니다. 남는 위험은 커넥터 하나가 풀려 같은 SMPS의 나머지 하나에 40A가 몰리는 경우뿐이므로, **결합부 고정과 회로별 퓨즈(또는 온도 감시)를 합격 조건**으로 요청합니다. XT90 정격 원문(Amass 사양서)은 이 환경에서 열지 못해 판매처 표기와 검색 요약으로 확인했으므로, 업체에 사양서를 요청해 확인합니다.

11 수평 배기 검토: 벽 쪽 더운 공기를 옆으로 빼기

패널을 세로로 16장(4~8층) 이어 붙이면, 패널마다 뒤로 내보내는 열(장당 약 230~250W)이 벽 쪽 공간을 따라 위로 쌓입니다. 이 열을 위로 올려보내지 않고 몇 장마다 끊어서 **옆(수평)으로 빼내는 방법**을 기구 쪽에서 구상하고, 열계산 쪽에서 효과를 계산했습니다. 2안(SMPS 핀 함체 B·D), 7월 설계와 8월 평균일 기준입니다.

막힌 채로 위로 이어지면 최상단 SMPS가 85~94°C까지 올라갑니다. 벽 쪽 공간 깊이 150mm에서 최상단 뒤 공기가 39K, 200mm에서 30K 올라갑니다. 100mm면 핀 함체가 공간을 막아 120°C에 이릅니다.

자연 굴뚝 효과만으로는 한계가 있습니다. 1m 높이 굴뚝이 만드는 압력이 0.2~0.7Pa밖에 안 돼서, 매 장마다 끊고 배기구를 키워도 뒤 공기 상승이 11~18K 아래로 내려가지 않습니다.

옆으로 보낼 수 있는 거리는 약 1m(패널 1~2열)까지입니다. 그보다 멀면 공기가 쌓여 마찰이 급격히 커지고 상승폭이 두 배 이상 됩니다. 파사드 끝까지 몇 m를 끌고 가려면 통로를 400mm 이상으로 키우거나 팬이 필요합니다.

바람은 굴뚝 효과보다 5~20배 강합니다. 2m/s 미풍만으로 3~4Pa가 생겨 크게 도움이 되지만 방향이 바뀌면 역류합니다. 그래서 설계는 무풍(여름 한낮 최악)으로 하고, 양쪽 끝에 루버를 둬서 풍향과 관계없이 한쪽은 들어오고 한쪽은 나가게 합니다.

목표(최상단 SMPS ≤60°C)를 맞추는 조합: 핀 함체 D + 벽 쪽 공간 200mm + 매 장 차단(자연 배출 60.4°C, 경계), 또는 핀 함체 B·D + 1~2장마다 차단 + 소형 수평 팬(패널당 1~8W)입니다.

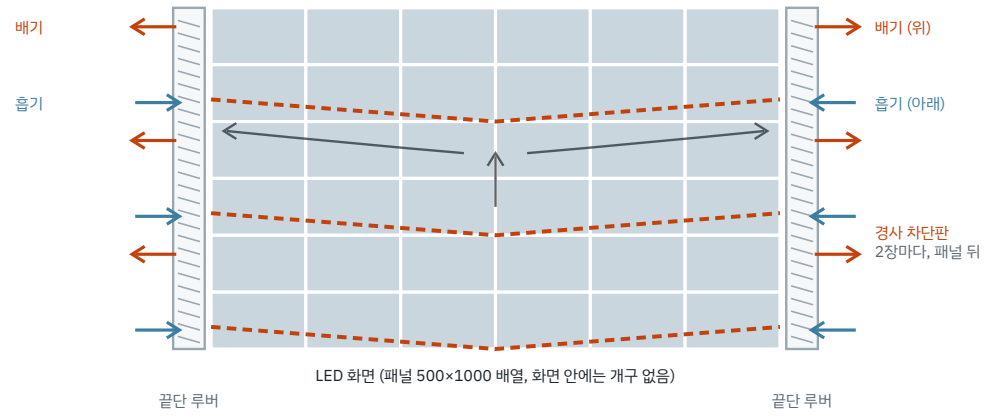


그림 8. 권장 개념(A안) 입면도. 벽 쪽 공간에 2장 높이마다 가운데가 낮은 경사 차단판을 두면, 올라온 더운 공기가 차단판 아래를 타고 배열 양 끝으로 이동해 끝단 루버 위쪽으로 나갑니다. 신선한 공기는 각 구간 아래쪽 루버로 들어옵니다. 개구가 LED 화면 안에 생기지 않고 배열 양 끝(폭 100~200mm 띠)에만 생깁니다.

	A 경사 차단판 + 끝단 루버	B 슬래브 라인 수평 덕트	C 이음부 횡류팬	D 수평 이음 배기 틈	E 한쪽 흡기·반대쪽 배기
방식	2~3장마다 V형 차단판(경사 10~20°), 배열 양 끝 세로 루버로 배출	층 슬래브 높이에 150~300mm 덕트 띠, 건물 모서리나 루버 띠로 배출	수평 이음에 크로스플로우 팬	2~3행마다 이음을 10~20mm로 넓혀 후드 달린 배기 틈으로	구간마다 한쪽 끝 흡기, 반대쪽 끝 배기
LED 화면 영향	**없음** (끝단만)	층마다 LED 없는 가로 띠	이음 확대 (중)	2~3행마다 가로 줄	없음 (끝단만)
빗물·바람	끝단 방우 루버 + 메시로 관리 쉬움. 측풍 시 한쪽이 흡기로 바뀜	밴드 루버로 관리 쉬움	이음으로 빗물 유입, 모터 침수	정면 비바람에 직접 노출, 역류 가능	측풍에 크게 좌우됨
화재 확산	차단판이 세로 공간을 끊음 (양호)	슬래브 라인 차단 (최상)	별도 차단 필요	차단판 있으면 양호	양호
정비	루버는 끝단에서 접근, 차단판은 거의 무정비	밴드 점검구 (양호)	옥외 회전체 교체 (불리)	전 폭 후드·메시 청소	A와 같음
비용·복잡도	중	중~상	상 (전원·제어)	중	중
판정	**1순위**	**2순위** (띠 허용 시)	보조용	이음 확대 허용 시	배열 폭이 좁을 때

실내나 천장으로 배기하는 방법은 제외했습니다. 열·습기·연기가 실내로 들어오고, 방화구획 관통과 냉방 부하 증가, 인허가 문제가 있기 때문입니다. 배열 끝단에 세로 굴뚝을 따로 두고 옥상으로 빼는 방법은 층마다 방화 댐퍼가 필요해 비용과 정비 부담이 큽니다.

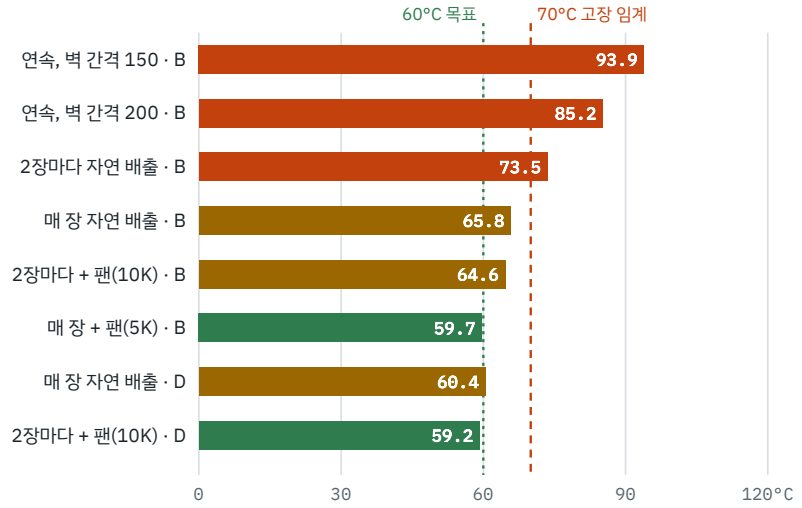


그림 9. 수평 배기 방식별 최상단 패널의 SMPS 케이스 온도(7월 설계, 16장 적층, B·D는 핀 함체 크기). 자연 배출은 몇 장마다 끊어도 60°C까지 내려가지 않습니다. 매 장 차단하고 핀 함체를 D로 키우거나 소형 팬을 쓰면 목표 근처에 들어옵니다. 배기구 순면적은 공간 단면의 50%로 계산했습니다.

벽 간격 200mm, 자연 배출	뒤 공기 상승	최상단 SMPS B (7월 / 8월
매 장마다 차단	17.5 K	65.8 / 62.
2장마다	22.2 K	73.5 / 70.
3장마다	25.6 K	78.0 / 74.
4장마다	28.3 K	81.4 / 78.

소형 수평 팬 (패널당)	필요 풍량	팬 전력	최상단 SMPS B / D (
뒤 공기 상승 ≤10K	71 m³/h	0.8~3.9 W	
뒤 공기 상승 ≤5K	142 m³/h	1.6~7.9 W	

배기구 순면적 (200mm, 매 장)	100	250	500	1,000	2,00
뒤 공기 상승	47.5	26.1	17.5	13.2	1

옆으로 보내는 거리 (2장마다, 200mm)	0.5 m	1 m	2 m	4 m
뒤 공기 상승	22 K	26 K	37 K	57 K
최상단 SMPS B	74°C	77°C	84°C	99°C

배기구 순면적은 열 1개(폭 500mm)당 공간 단면의 50~100%(벽 간격 200mm면 500~1,000cm²)까지 의미가 있고, 그 이상은 효과가 거의 없습니다. 팬 전력은 패널 열부하(약 600W)의 0.3~1.3%입니다. 아래 구간에서 나온 더운 공기를 위 구간이 다시 빨아들이는 효과는 0으로 계산했으므로, 실제로는 배기와 흡기 위치를 엇갈리게 해야 합니다.

권장 구성

- **방식:** A안(경사 차단판 + 배열 끝단 루버). 입면에서 층별 띠를 받아들일 수 있으면 슬래브 라인은 B안 덕트, 층 중간은 A안 차단판으로 혼합
- **벽 쪽 공간:** 200mm 이상(핀 함체 D는 100mm 공간에 들어가지 않음)
- **차단 간격:** 1~2장마다. 차단판은 패널이 아니라 건물 서브프레임에 고정해서 패널 교체와 분리
- **배기구:** 배열 양 끝에 방우 루버 + 메시, 열당 순면적 500~1,000cm². 위는 배기, 아래는 흡기로 나누고 사이에 분리 립
- **팬:** 목표를 확실히 맞추려면 구간마다 소형 수평 팬(패널당 1~8W) + 고장 감시. 팬이 멈추면 자연 배출 + 휘도 감축으로 버팀

먼저 확인할 것

- 벽 쪽 공간의 실제 깊이와, 패널 열 사이가 가로로 이어져 있는지(브래킷·SMPS 함체가 막는 비율)
- 배열 폭과 끝단까지의 거리. 1m를 넘으면 가운데를 나눠야 함
- 배열 양 끝에 루버 띠(폭 100~200mm)를 둘 수 있는지 입면 협의
- 차단판을 고정할 서브프레임 위치, 차단판을 지나는 배선의 그로밋
- 건물 모서리 풍압 자료(역류·풍력 이용 검토용)

중재 의견: 수평 배기는 효과가 분명합니다. 최상단 SMPS가 85~94°C에서 60~66°C로 내려갑니다. 다만 자연 배출만으로는 무풍 한낮에 목표를 넘으므로, **A안 + 벽 쪽 공간 200mm + 1~2장마다 차단 + 핀 함체 D**를 기본으로 하고, 소형 수평 팬을 추가 옵션으로 두는 것을 권합니다. 또 이번 계산은 핀 함체가 벽 쪽 공간을 일부

막는 효과를 넣어서, 앞(00·05장)에 쓴 적층 상승폭(14~27K)보다 크게 나왔습니다(150mm 기준 39K). 앞 장 수치를 이번 결과로 맞출지는 확인 후 반영하겠습니다.

12 검토 항목 (위치 · 문제점 · 예상 현상 · 개선 검토 사항)

추가 v1 요청서에 없던 항목 · 수정 새 조건으로 바뀐 항목

#	검토 위치	문제점	예상 현상	개선 검토 사항
1-1	**FPCB 90° 굴곡부 / 프레임·슬롯 모서리** 수정	30×100mm FPCB 11개가 윗면 프레임을 지나며 꺾임. 절단면 버와 날카로운 모서리	풍진동·열팽창으로 커버레이 마모 → 도체 노출, 단락·단선	슬롯 모서리 R0.5 이상 또는 C0.5, 디버링 검사. EPDM U형 엣지 트림. 개별 또는 2~3개 단위 슬롯. 굴곡 R은 두께 10배 이상. 굴곡 지그로 R을 일정하게
1-2	**FPCB 실리콘 피복** 수정	피복 범위·재질 미정	초산형이면 구리 부식. 굴곡부를 덮으면 경계에서 크랙	중성(알콕시)형, 저분자 실록산. 굴곡 R 구간 ±3mm는 비우거나 저경도. 슬롯 접촉부는 피복이나 PI 테이프. 패널 쪽 커넥터는 포팅이나 개스킷 커버
1-3	**FPCB 길이·배열** 추가	100mm 안에서 굴곡·관통 후 여유 40~60mm. 11개 × 30mm = 330mm 폭	탈착 여유가 없어 현 구조에서는 SMPS 교체 시 FPCB 분리 필요. 1안에서는 Hub 위치에 따라 길이 부족	FPCB 경로 단면도 요청. 1안이면 Hub를 판 뿌리에 패널과 평행하게, 아니면 150mm 이상 재설계. 피치 확정, 번호 실크와 커넥터 키잉, 위치결정핀
1-4	**공기층 윗부분 (FPCB 관통 구간)** 추가	윗면이 막혀 덥고 습한 공기가 모임	야간 결로가 FPCB와 패널 커넥터로 떨어짐 → 부식	2안으로 공기층을 150mm로 줄이거나 1안으로 없앰. 관통부 직전 U자 drip loop. 위쪽 50~80mm 구간 피복·코팅. Hub 함체를 윗면 프레임 바로 아래에 붙여 FPCB 외부 노출을 없앰
2-1	**Hub·SMPS 밀폐 함체** 수정	SMPS 손실 약 55W가 밀폐 함체 안에 갇힘. 함체가 패널 열을 받는 Al판에 붙어 있음	케이스 약 87°C(70~117) → 디레이팅, 오동작, 수명 단축	2안: SMPS를 세로 핀 함체로 분리(B 59°C / D 54°C). 1안이면 써멀패드와 세로 핀 필수(약 62°C). 장기적으로 3안
2-2	**하단 개방 공기층 (500×20×300)** 수정	출구가 없는 막힌 공간. 윗면·옆면·뒷면 모두 개구 불가	공기층 약 84°C, PV 약 95°C	2안으로 공기층 높이를 150mm로 줄여 뜨거운 면적을 절반으로. 1안이면 공기층 자체가 없어짐
2-3	**벽 쪽 공간 (세로 연속 배치)**	패널마다 뒤로 230~250W를 내보내고, 핀 함체가 공간 일부를 막음	막힌 채 16장이 이어지면 최상단 뒤 공기 +30~40K, SMPS 85~94°C(벽 간격 100mm면 120°C)	A안: 1~2장마다 경사 차단판 + 배열 양 끝 루버(열당 순면적 500~1,000cm²)로 수평 배기. 벽 간격 200mm 이상, 핀 함체 D. 필요 시 소형 수평팬(11장)
2-4	**LED 유리층** 추가	공기층 구간 전면 유리층이 계산상 90°C 안팎	LED 필름, OCA 접착층, 커넥터 허용 온도 초과 가능	업체에 각 소재 허용 온도 확인. 온도 연동 휘도 제한(예: 패널 65°C부터 단계적으로)
2-5	**밀폐 함체 결로**	주야 온도차로 함체가 호흡함	습기 유입 → 결로, 부식	ePTFE 압력평형 벤트, 최저점 배수공, 컨포멀 코팅, IP65 이상, 커넥터 하향 배치
3-1	**SMPS·5V 연결 (XT90 ×4 + 실리콘 10AWG)**	SMPS당 40A를 XT90 2개로 나눠 커넥터당 20A. 방수·잠금 없음	정상 운전은 여유(75°C에서 하우징 94~99°C). 커넥터 1개가 풀리면 같은 SMPS의 나머지 1개에 40A → 146°C 이상, 용융 위험	XT90H 4개(SMPS당 2개), 실리콘 10AWG 0.5m, 두 SMPS 5V를 묶지 않음. 결합부 브래킷·P-클램프 고정, 회로별 30A 퓨즈나 NTC 온도 감시, SMPS당 40A 휘도 상한. 출하 시 mΩ 측정과 열화상 검사(10장)
3-2	**PV 직류와 LED 저전압**	PV 수백 V 이상과 5V(3안이면 48V)가 같은 공간	절연 파괴, DC 아크, 화재	PV 전용 케이블·커넥터, 격벽, 등전위 접지. 합지 후 PV 인증 유효성 확인

3-3	**외벽 AC 입력 SMPS (장기)** 추가	AC 입력, PFC, 고압 전해 콘덴서가 외벽에 있음	옥외 고장원, 고소 정비, 감전 위험	3안: 48V 배전 + 분전반 실내, 패널에는 DC-DC만. 지금은 2안 함체와 DC-DC 함체 장착 호환만 확보

13 우리 요청사항 수정 제안

기존 요청	수정 제안	근거 (계산)
한여름에도 50°C 내외 유지	**외기 38°C, 일사 650W/m², 무풍, 400W, 2시간 열평형에서:** 팬 정지 상태에서도 SMPS 케이스 ≤60°C, 팬 동작 시 ≤50°C, 전해콘덴서 ≤75°C	자연대류만으로는 최선(D안)도 약 54°C(보수 60°C). 50°C 이하는 팬을 써야 안정적으로 도달
단열재로 복사열 차단	보조 수단으로 둡니다. 핵심은 SMPS 열을 핀으로 바깥 공기에 내보내는 것	복사 차단 효과는 −2K 내외. SMPS 자체 손실만으로 74.5°C
SMPS를 패널과 이격 (커버 수직 배치)	1안(뒷판 수직)은 **써멀패드와 세로 핀을 반드시 함께** 적용. 벽 간격 250mm 이상과 교체 접근 경로가 있을 때만. 그렇지 않으면 2안	함체 그대로 세우면 −3K(84°C). 핀을 달면 약 62°C
통기 구조 검토	공기층 윗면·옆면·뒷면은 개구 불가. 2안으로 공기층 높이를 150mm로 줄이고, 벽 쪽 공간은 2~3장마다 수평 차단	공기층 −2K, 뜨거운 면적 절반. 위층 누적 14~27K
SMPS 별도 커버, 방수·방열 알루미늄, 히트싱크	2안: 세로 핀 일체형 Al 함체. 베이스 300×250 이상, 핀 높이 40~50, 두께 2, 간격 10.5mm. IP65 이상 + ePTFE 벤트	B안 59°C, D안 54°C
히트싱크에 방수 fan	팬은 50°C 목표를 위한 보조로 사용(IP68, 회전수 감시). 팬이 멈춰도 60°C 이하가 되도록 핀 설계	팬 사용 시 46°C, 미사용 시 54~59°C
SMPS 2년 내 교체 가능	목표 교체 주기 5년 이상(장수명 콘덴서 + 케이스 60°C 이하). 교체 단위는 SMPS 함체 원터치. 장기적으로는 3안으로 정류기를 실내로	케이스 87°C와 57°C는 콘덴서 수명이 약 8배 차이(10°C마다 2배)
(v1 장기안 재추가)	3안: 48V 배전 + 분전반 실내 이전. 지금은 2안 함체를 DC-DC 함체로 바꿀 수 있게 장착 인터페이스 표준화	패널 쪽 발열 55→19W, 정류기 실내 정비
FPCB 실리콘 위치 공유	위치, 재질(중성 알콕시), 두께, 굴곡 R, 보강판, 관통부 실링 방식, 경로 단면도까지 표기	FPCB 여유 길이 40~60mm, 윗부분 결로 구간

중재 의견: 열계산 쪽은 자연대류를 우선하라고 했고, 우리 요청서는 팬 부착을 요구합니다. 계산으로 보면 50°C 이하는 팬 없이 안정적으로 도달하기 어렵습니다. 그래서 **팬은 유지하되, 팬이 고장 나도 60°C 이하로 버티는 자연대류 설계를 합격 조건**으로 두는 것으로 합쳤습니다.

14 유지보수 문의 보강

	① 패널 단위 교체	② N개 모듈 통째 교체	③ SMPS 함체만 원터치 교체 (2안)	④ 실내 정류기 교체 (3안)
교체 중량	15~20 kg/장 (추정)	수십~100 kg+	3~5 kg	분전반 모듈
접근	외부 곤돌라·로프	곤돌라 + 크레인	캣워크나 실내 점검구에서 가능하게 설계 가능	실내
1건 작업시간 (추정)	1~2 h + 장비 설치	반나절~1일	15~30 min	수 분 (핫스왑)
FPCB 분리	필요	필요	불필요	불필요
적합 용도	LED·유리 파손	대규모 리뉴얼	SMPS·팬 일상 정비	장기 운영

함체 2분할 권장

- **고정부:** FPCB 11개 + Hub board를 넣은 작은 인터페이스 함체. 공장에서 포팅·실링하고 현장에서는 열지 않습니다.
- **교체부:** SMPS 2대를 넣은 핀형 방열 함체. 열 대책과 교체 단위가 같아집니다. 3안 전환 시 DC-DC 함체로 바꿔 끼웁니다.
- 두 함체는 XT90H 4개(SMPS당 2개)와 실리콘 10AWG 0.5m로 연결합니다. 커넥터는 함체 안에 두고 결합부를 고정하며, 교체 때는 XT90만 분리하면 됩니다(10장).

캣워크 유무

- **있음:** 배면 탈착형 함체로 상시 접근할 수 있고 1안도 선택지가 됩니다.
- **없음:** 1안은 교체 접근이 어려워 2안이 유리합니다. 곤돌라·로프 고소작업(풍속 10m/s 이상이면 중지)이나 실내 점검구가 필요합니다.
- 함체를 앞에서 뺄지 뒤에서 뺄지가 이것으로 정해지므로 빨리 확정해야 합니다.
- 함체 온도, SMPS DC-OK, 팬 회전수를 원격 감시하면 교체를 묶어서 처리할 수 있습니다.

15 업체 질의·검증 요청

순위	항목	요청 내용
P1	유지보수 개념	교체 단위, 교체 방향, 접근 방식(곤돌라·실내·캣워크), 1건당 소요시간. 함체 2분할 수용 여부
P1	SMPS 데이터	HWA805V0J-SS 공식 데이터시트: 외형 치수, 효율 곡선, 동작온도, 디레이팅 곡선, 케이스 측정점(Tc), 전해콘덴서 사양, remote sense 지원 여부
P1	벽 쪽 공간	패널과 벽 사이 간격(200mm 이상 가능 여부), 패널 열 사이가 가로로 이어져 있는지, 층간 차단 계획. 1안 적용 가능 여부 판단용
P1	수평 배기	배열 양 끝 루버 띠(폭 100~200mm) 설치 가능 여부, 경사 차단판 고정용 서브프레임, 배열 폭과 끝단까지 거리, 슬래브 라인 덕트 띠 허용 여부, 건물 모서리 풍압 자료
P1	2안 상세	SMPS 핀 함체 위치·고정 방식, Hub 함체 축소 후 공기층 치수, 5V 연결 구성(XT90H 4개, 실리콘 10AWG 0.5m, 결합부 고정, 회로별 30A 퓨즈나 온도 감시), Amass XT90 사양서와 온도상승 데이터, 63°C 20A 2시간 열시험 결과
P1	열해석	세로 3장 이상 + 벽 쪽 공간 포함 CFD. 외기 35/38°C, 일사 375/650W/m², 무풍~2m/s, 400W/200W. 팬 정지와 SMPS 1대 고장 케이스
P2	1안 검토 시	Hub 위치(판 뿌리, 패널과 평행), FPCB 경로 단면, 외벽 돌출 깊이, 판 단면·뿌리 체결·진동 검토서, 교체 접근 경로
P2	3안 전환 대비	SMPS 함체와 DC-DC 함체 장착 호환, 48V 커넥터 사양, 분전반 정류기·보호 구성, 배선 경로
P2	FPCB	경로 단면도(커넥터 위치, 오프셋, R, 관통부), 실리콘 사양
P2	LED층 허용 온도	LED 필름, OCA, 커넥터의 최고 허용 온도와 온도 연동 휘도 제한 가능 여부
P3	실증 시험	남향 수직 3×3 이상 목업, 7~8월과 9월 맑은 날 각 7일 이상. SMPS 케이스, 콘덴서, 공기층 위·아래, PV 배면에 열전대

16 업체 전달용 문안 (구어체 초안)

1. FPCB

패널이랑 Hub board 잇는 FPCB 11개(30×100mm)가 윗면 프레임을 지나면서 90도로 꺾이는데, 그 모서리가 날카로워 보여요. 바람이나 열팽창으로 조금씩 흔들리면 피복이 닳아서 단락이나 단선이 날 수 있으니까 슬롯 모서리 R0.5 이상이나 면취, 디버링하고 엣지 트림 넣어주세요. 실리콘은 초산형 쓰면 구리가 부식되니까 중성(알콕시)형으로 해주시고, 굴곡 부위는 비워주세요. 다음 도면에 실리콘 위치랑 재질, 두께, 굴곡 R, FPCB 경로 단면도까지 같이 부탁드려요. 공기층 윗부분이 막혀 있어서 결로가 생길 수 있으니 FPCB에 물이 타고 내려가지 않게 루프를 주고, 패널 쪽 커넥터는 보호해주셨으면 해요.

2. 방열
저희가 7월 한낮 조건으로 계산해보니까 지금 구조에서는 SMPS 케이스가 87도 정도까지 올라가요. 원인이 햇빛보다 SMPS 자체 열 55W 정도가 밀폐 함체 안에 갇히는 게 더 커요. 그래서 SMPS 열을 핀으로 바깥 공기에 내보내는 구조가 필요해요.

저희는 SMPS만 별도 알루미늄 함체로 빼서 바깥에 세로 방향 핀을 다는 방식을 우선 제안드려요. 베이스 300×250 이상, 핀 높이 40~50mm, 두께 2mm, 간격 10.5mm 정도면 54~59도 정도가 나와요. SMPS가 빠지면 Hub 함체가 작아져서 공기층도 150mm 정도로 줄어드니까 패널 쪽에도 도움이 돼요. 함체는 벽 쪽 그늘에 두고, 방수는 IP65 이상에 벤트랑 배수공 넣어주세요. Hub 함체와 연결하는 5V는 XT90 4개(SMPS 한 대당 2개)에 실리콘 케이블 0.5m로 가려고 해요. SMPS 한 대가 40A를 내니까 커넥터 하나에 20A씩 흐르고, 케이블은 10AWG면 충분해요. Hub 쪽에서도 두 SMPS 5V는 서로 묶지 말아주세요. XT90은 방수랑 잠금이 없으니까 함체 안에만 두고, 결합부는 브래킷이랑 클램프로 고정해주세요. 커넥터 하나가 빠지면 같은 SMPS의 나머지 하나에 40A가 몰려서 녹을 수 있으니까, 회로마다 30A 퓨즈나 온도 센서도 넣어주세요.

뒷판을 패널과 수직으로 세워서 빼는 방법도 검토해봤는데, 함체를 그대로 세우면 3도 정도밖에 안 내려가고, 패드랑 세로 핀을 달아야 62도 정도가 나와요. 다만 벽이랑 간격이 250mm 이상 필요하고 앞에서는 교체가 어려워서, 캣워크나 실내 점검구가 있을 때만 의미가 있을 것 같아요.

팬은 달아주시되, 팬이 멈춰도 60도 이하는 유지되게 핀으로 설계해주시고, 팬 고장은 감지되게 해주세요. 팬이 돌 때는 50도 이하가 목표예요. 조건은 외기 38도, 일사 650W/m², 무풍, 400W로 잡고 싶어요. 그리고 패널을 세로로 쭉 붙이면 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 뜨거워져서, 막혀 있으면 맨 위 SMPS가 90도 가까이 올라가요. 그래서 패널 뒤 벽 쪽 공간에 1~2장마다 가운데가 낮은 경사 차단판을 넣고, 배열 양 끝에 루버를 달아서 더운 공기를 옆으로 빼는 방식을 제안드려요. 이렇게 하면 화면 안에는 구멍이 안 생기고 양 끝 띠만 필요해요. 벽이랑 패널 사이는 200mm 이상 확보해주시고, 끝까지 거리가 1m를 넘으면 가운데를 나눠야 해서 배열 폭도 알려주세요. 무풍일 때 확실히 하려면 구간마다 작은 팬을 다는 것도 옵션으로 검토해주세요.

3. 장기 사용
장기적으로는 SMPS를 48V로 올리고 AC-DC는 실내 분전반으로 가져가서, 패널에는 48V를 5V로 바꾸는 DC-DC만 두는 방식이 좋겠어요. 패널 쪽 발열이 3분의 1로 줄고, 고장이 잦은 정류기를 실내에서 바꿀 수 있어요. 지금 당장은 아니더라도, SMPS 함체를 나중에 DC-DC 함체로 바꿔 끼울 수 있게 장착 구조랑 커넥터 위치를 맞춰주셨으면 해요.

4. 문의
유지보수는 어떻게 생각하고 계세요? 한 패널씩 바꾸는 건지, 몇 장을 묶어 통째로 바꾸는 건지 궁금해요. 저희는 FPCB랑 Hub는 고정 함체로 두고 SMPS 함체만 커넥터로 빼는 방식이 좋을 것 같아요. 캣워크나 실내 점검구가 있는지, 벽이랑 패널 사이 간격이 얼마나 되는지도 알려주세요. HWA805V0J-SS 데이터시트랑 LED층 허용 온도도 받아볼 수 있을까요?

17 가정·확인 필요 사항과 출처

계산 가정 (결과에 영향 큼)

- SMPS 치수·효율은 형제 모델 값, 디레이팅은 HWA504V6-SS 데이터시트(−40~+70°C, 50°C부터 선형 감소) 참고
- 함체 340×200×50mm, 2안 Hub 함체 340×120mm, 패널 뒤 공기 외기 +3K
- 1안 판 220×380×3mm, 패널 뒷면을 보는 비율 0.35, 뿌리 전도 0.7W/K
- 3안 DC-DC 효율 95.5%, 포팅 모듈 2개(100×60×15mm), 허용 온도 약 100°C급
- 흡수율, PV 효율, LED 발열 비율, 서울 월별 대기 탁도. 정상상태·정오 순간값

확인 필요

- HWA805V0J-SS 공식 데이터시트
- 벽 쪽 간격·옆면 개방·층간 차단, 캣워크 유무
- 함체 실측 치수와 위치, PV 부하 연결 여부
- LED층 허용 온도, 실제 영상 평균 전력
- 48V 옥외 습윤 장소 허용 전압(KEC), IPC-2223 원문

1. HWAWAN HWA805V0J-SS (ledscreenparts)
2. HWAWAN HWA805V0A (controller-led)
3. HWAWAN HWA504V6-SS 데이터시트
4. KIEE 2008, 비환기 파사드 PV 모듈 온도 비교
5. DTU BIPV 1년 실증 (pv magazine)
6. FPCB 굴곡 반경 가이드 (IPC-2223 인용)
7. Amass XT90 (Maplin) · Amass XT90H (GetFPV) · Amass XT90 사양서 (원문 미열람)
8. 실리콘 케이블 UL3644 (Letronic)

9. 계산 모델: NOAA 태양위치, Kasten-Young 대기질량, Ineichen-Perez·Hottel 청천 모델, Hay-Davies 확산, Fresnel 입사각 손실, ElSherbiny-Hollands 수직공동, Bar-Cohen·Rohsenow 핀 간격, Arrhenius 10°C 법칙
